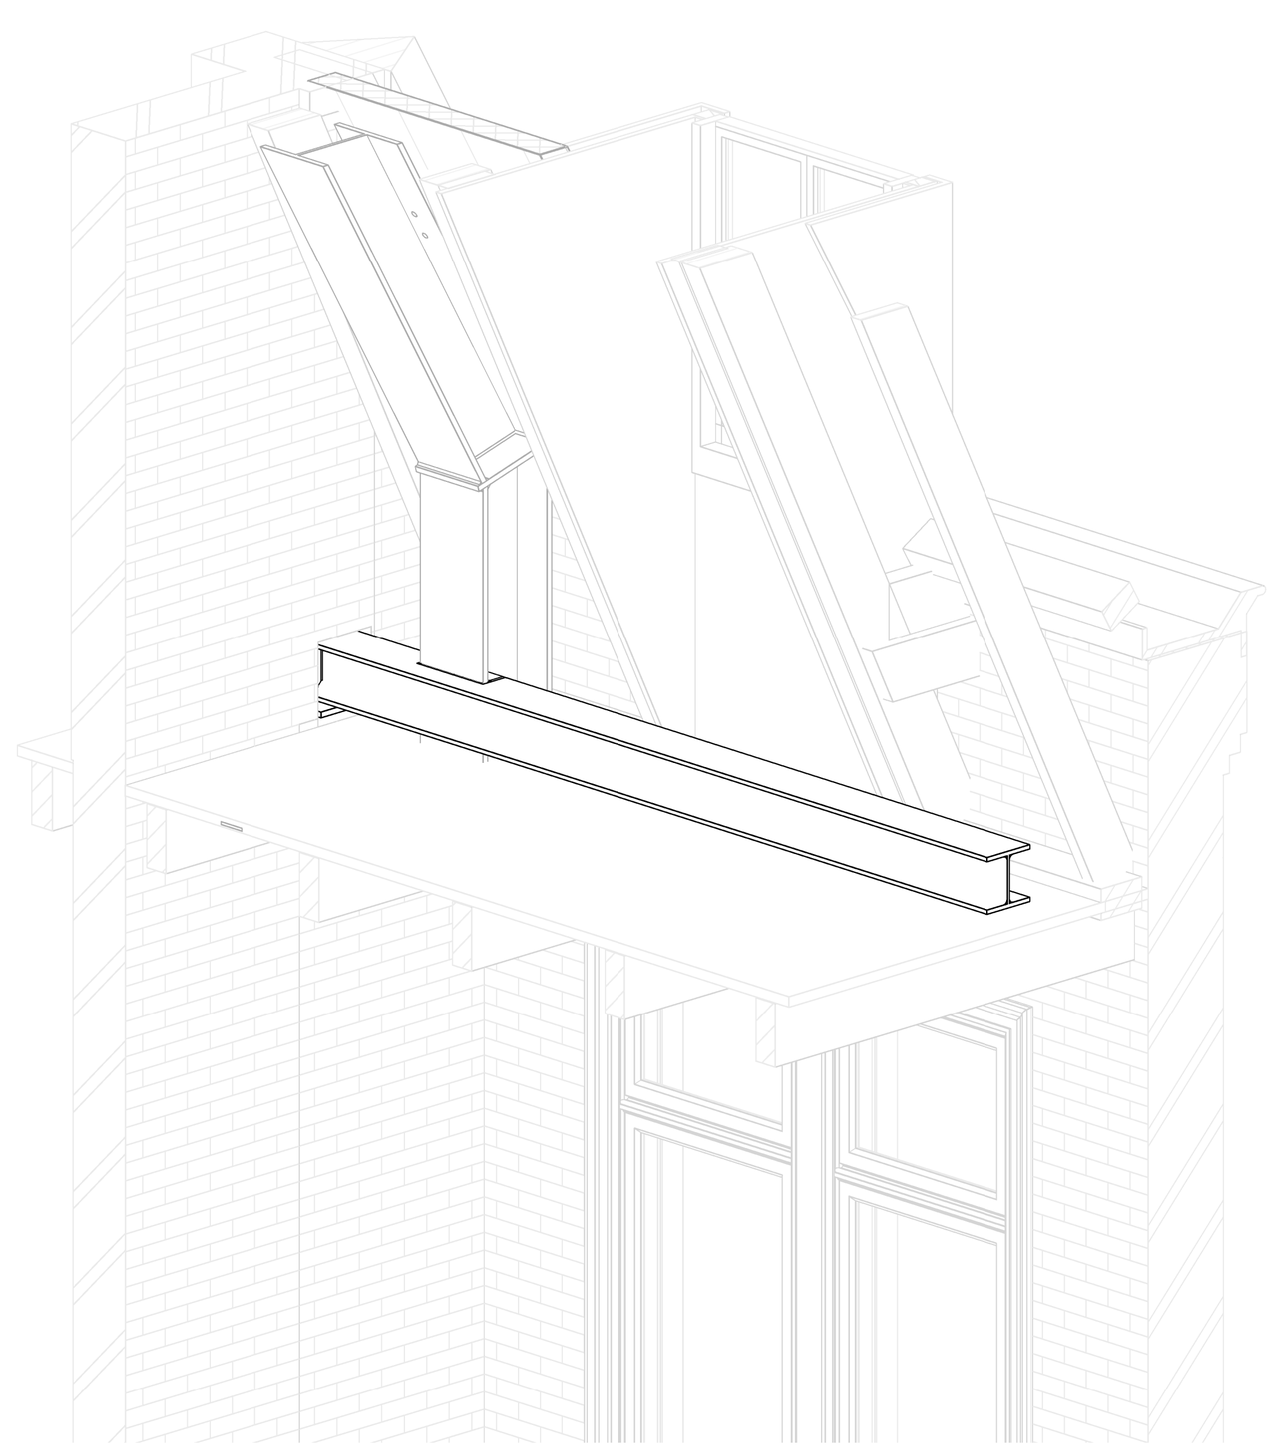

Stap 15

Check aanpassing staalconstructie t.p.v. dragend kozijn ZH gereed

Staalprofiel in het werk aflassen aan het reeds gemonteerde spant 3,
aansluitend vijzelen om het 'dragende kozijn' te ontlasten en tot slot ondersabelen;

voormalige oplegging spant op de 2e verdieping vrij hakken.

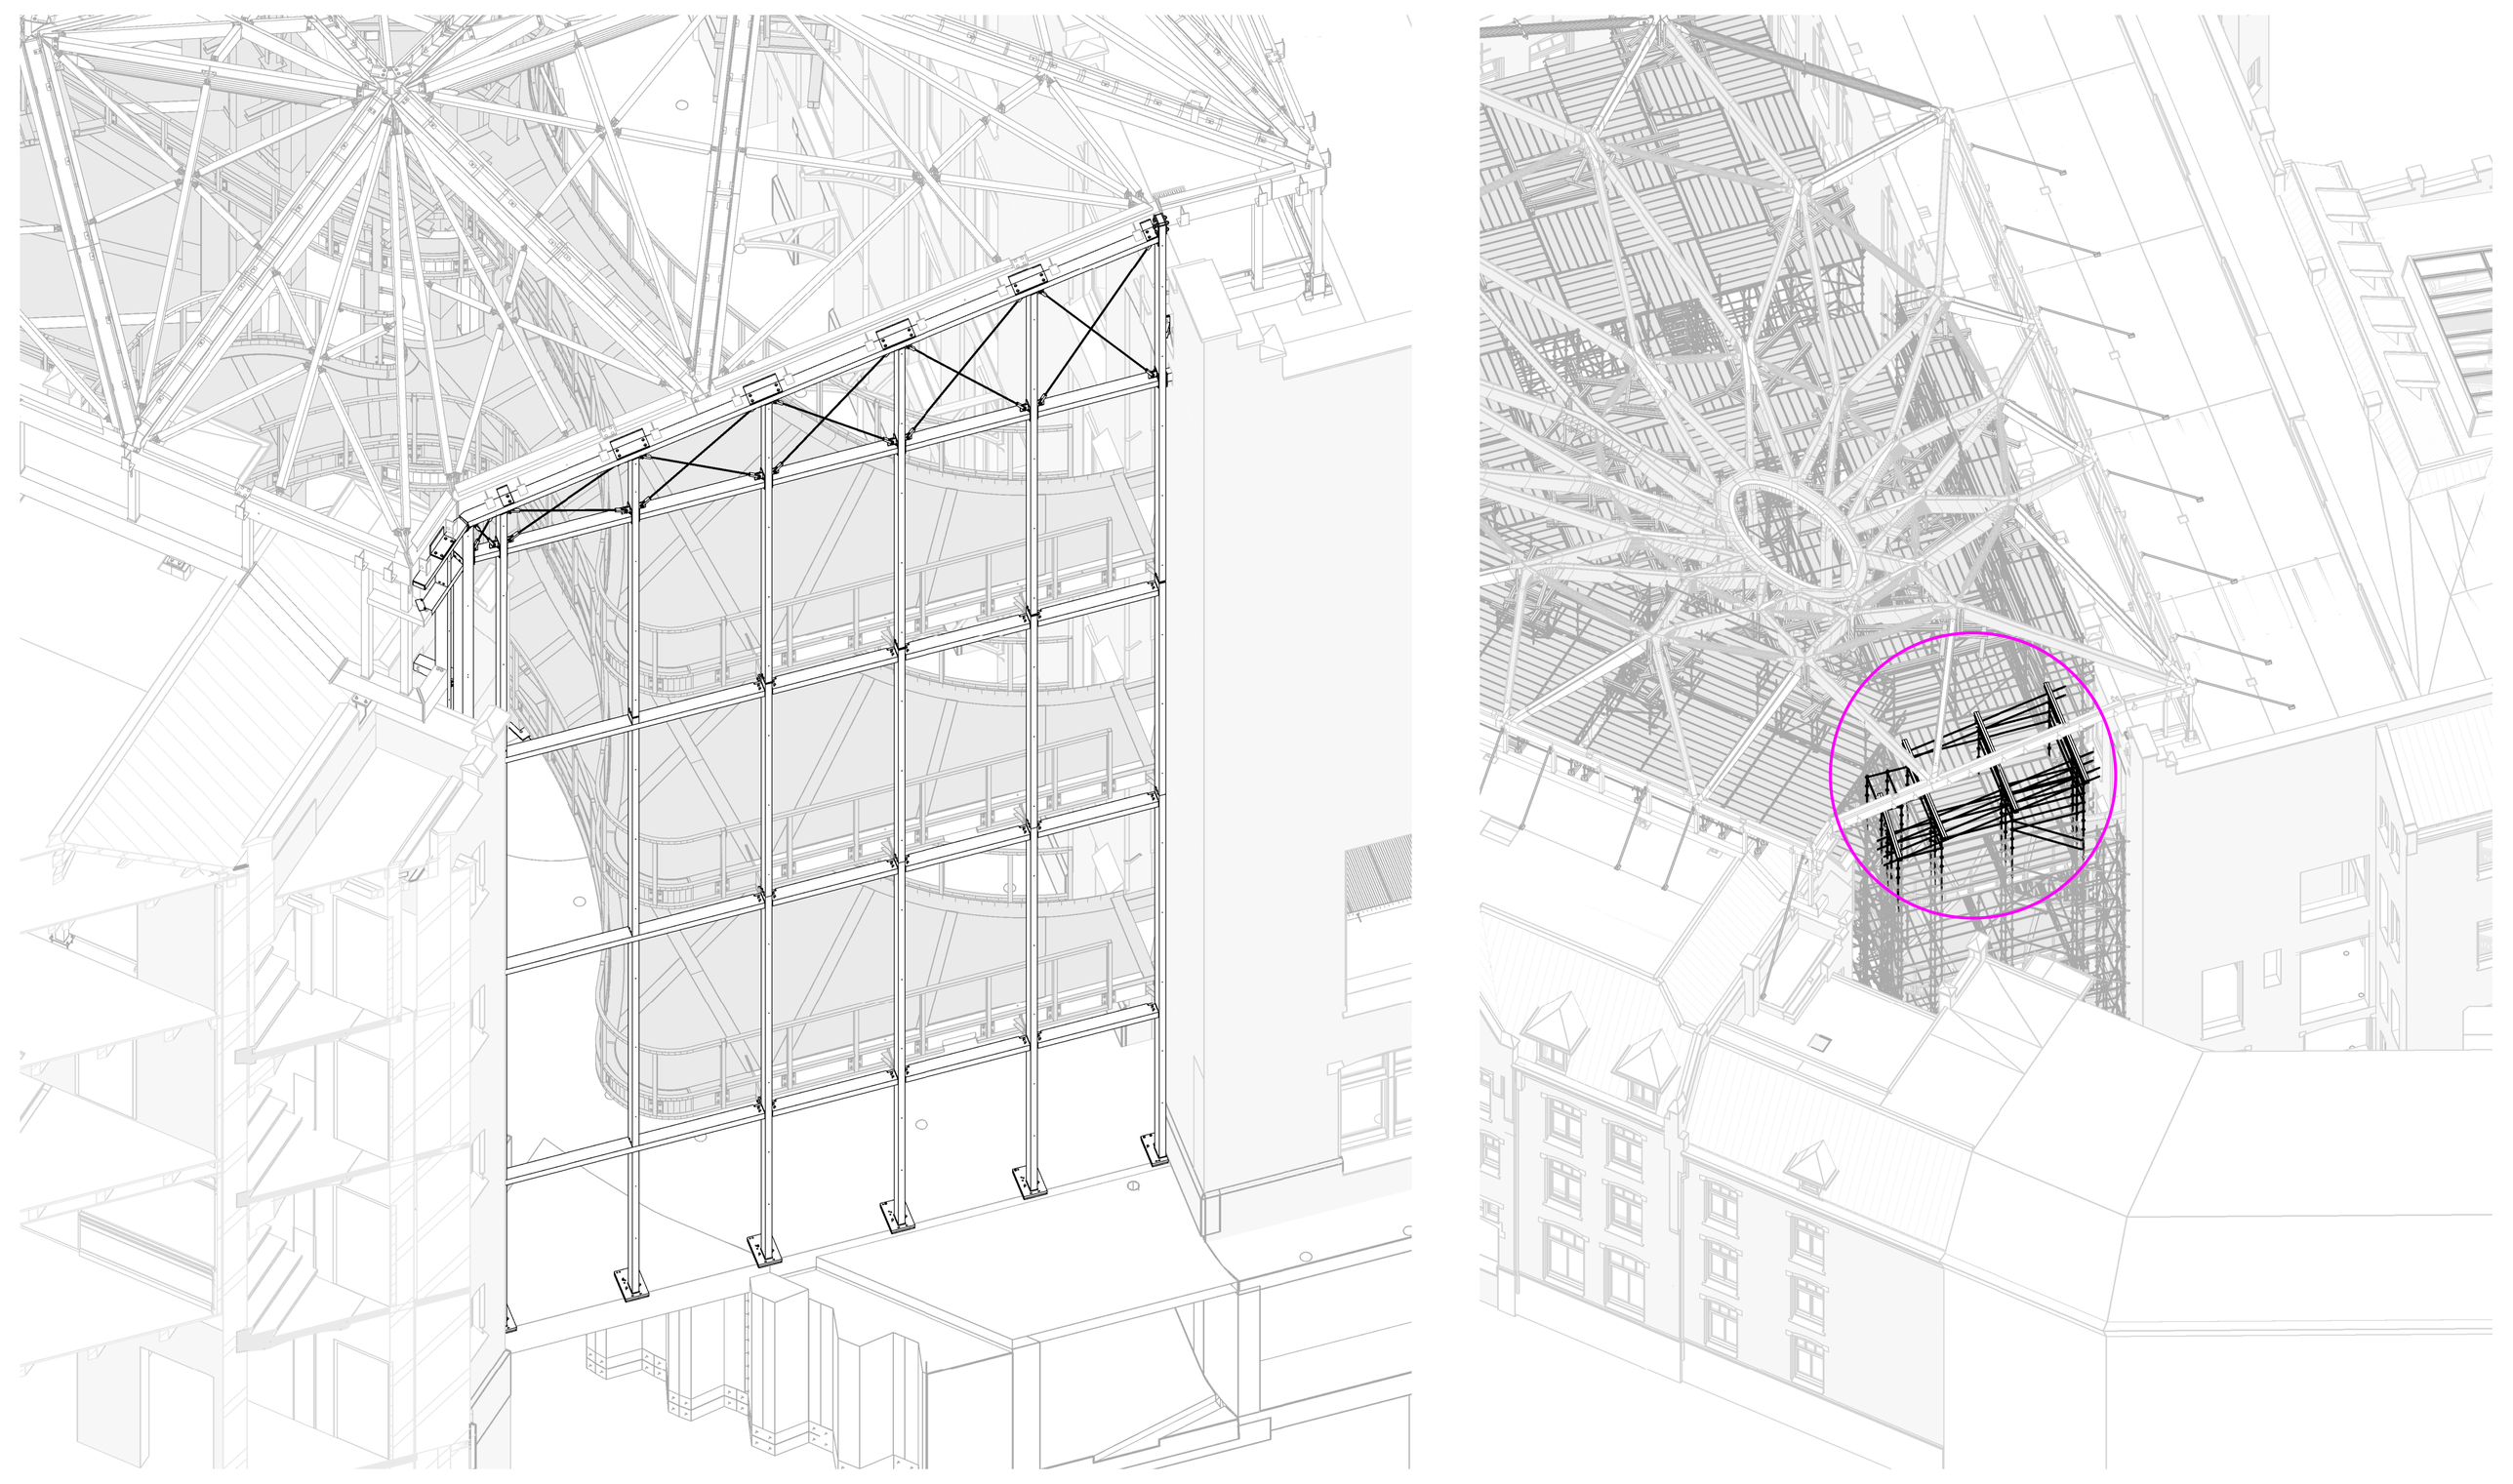

Stap 16a

Montage achterconstructie vliesgevel.

Check ruimte steiger t.b.v. ondersteuning gevelspant E van Ring F volledig gereed.

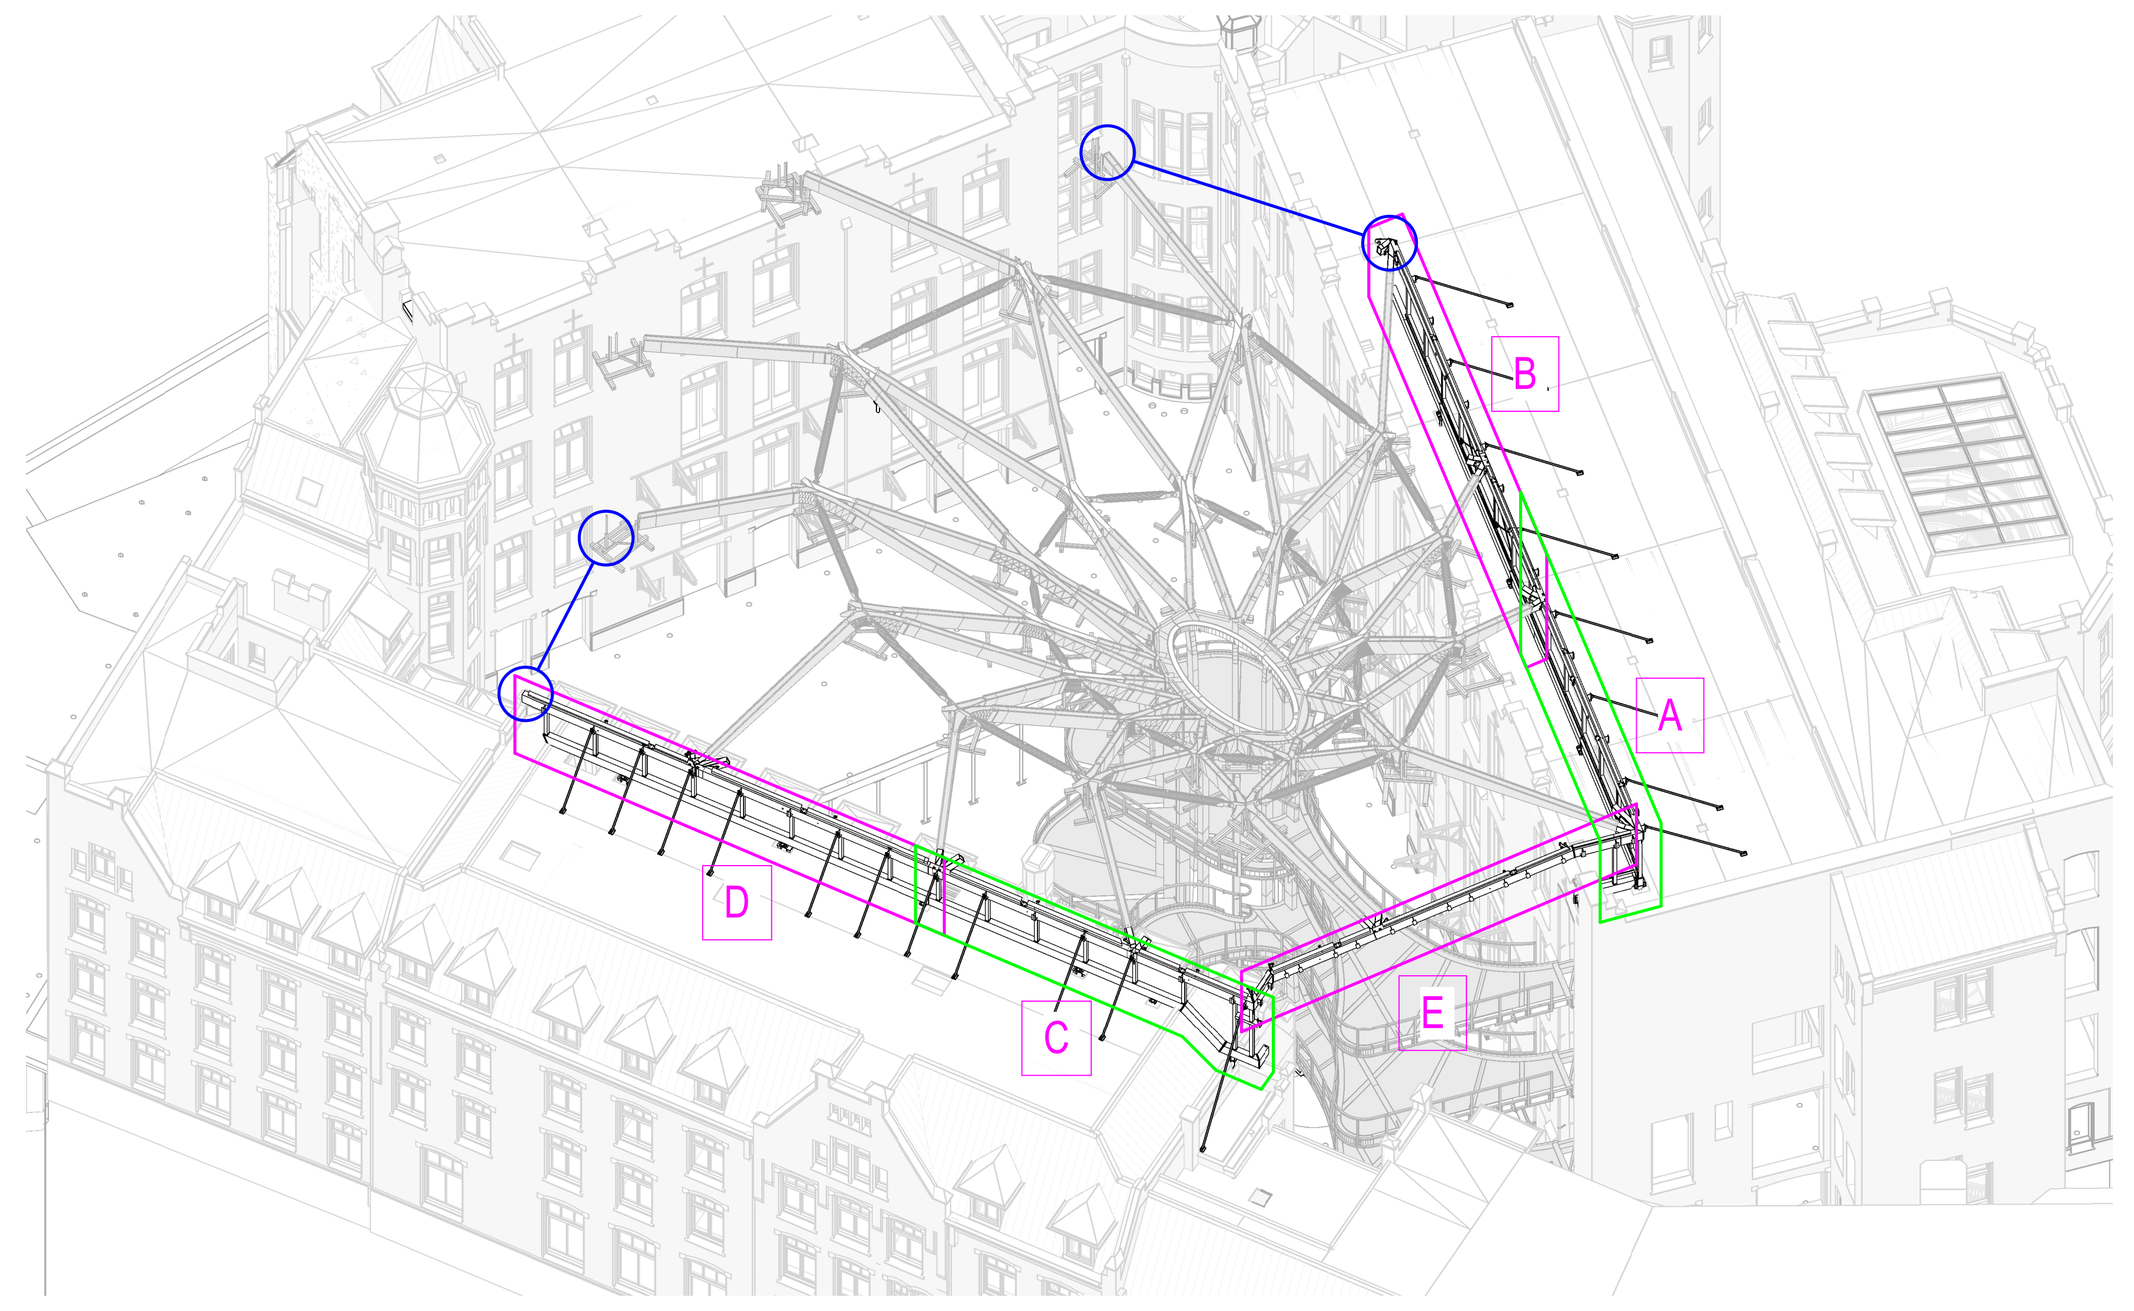

Stap 16b

Realiseren "stap 30; Spanten Ring F boven klinieken en zusterhuis." uit het montageplan van Buiting

Monteren Spanten Ring F in volgorde A t/m E. Montage gevelspanten A, B en E middels mobiele telescoopkraan (valt buiten bereik torenkraan).
Aandachtpunt: Bereikbaarheid positie mobiele telescoopkraan i.r.t. uitvoering WKO a/d Binnengasthuisstraat

Specificatie zwaarste deel:
 Merk: Spant Ring F; S70 (samengesteld spant)
 Lengte x breedte x hoogte: 15.560x1.500x3.185mm
 Eigen Gewicht: 4.550Kg

Eventueel tijdelijke voorzieningen toepassen t.b.v. spanten B en D (blauwe lijnen)
Aandachtspunt: Vulplaten volledig dragend aanbrengen (geen wiggen oid)

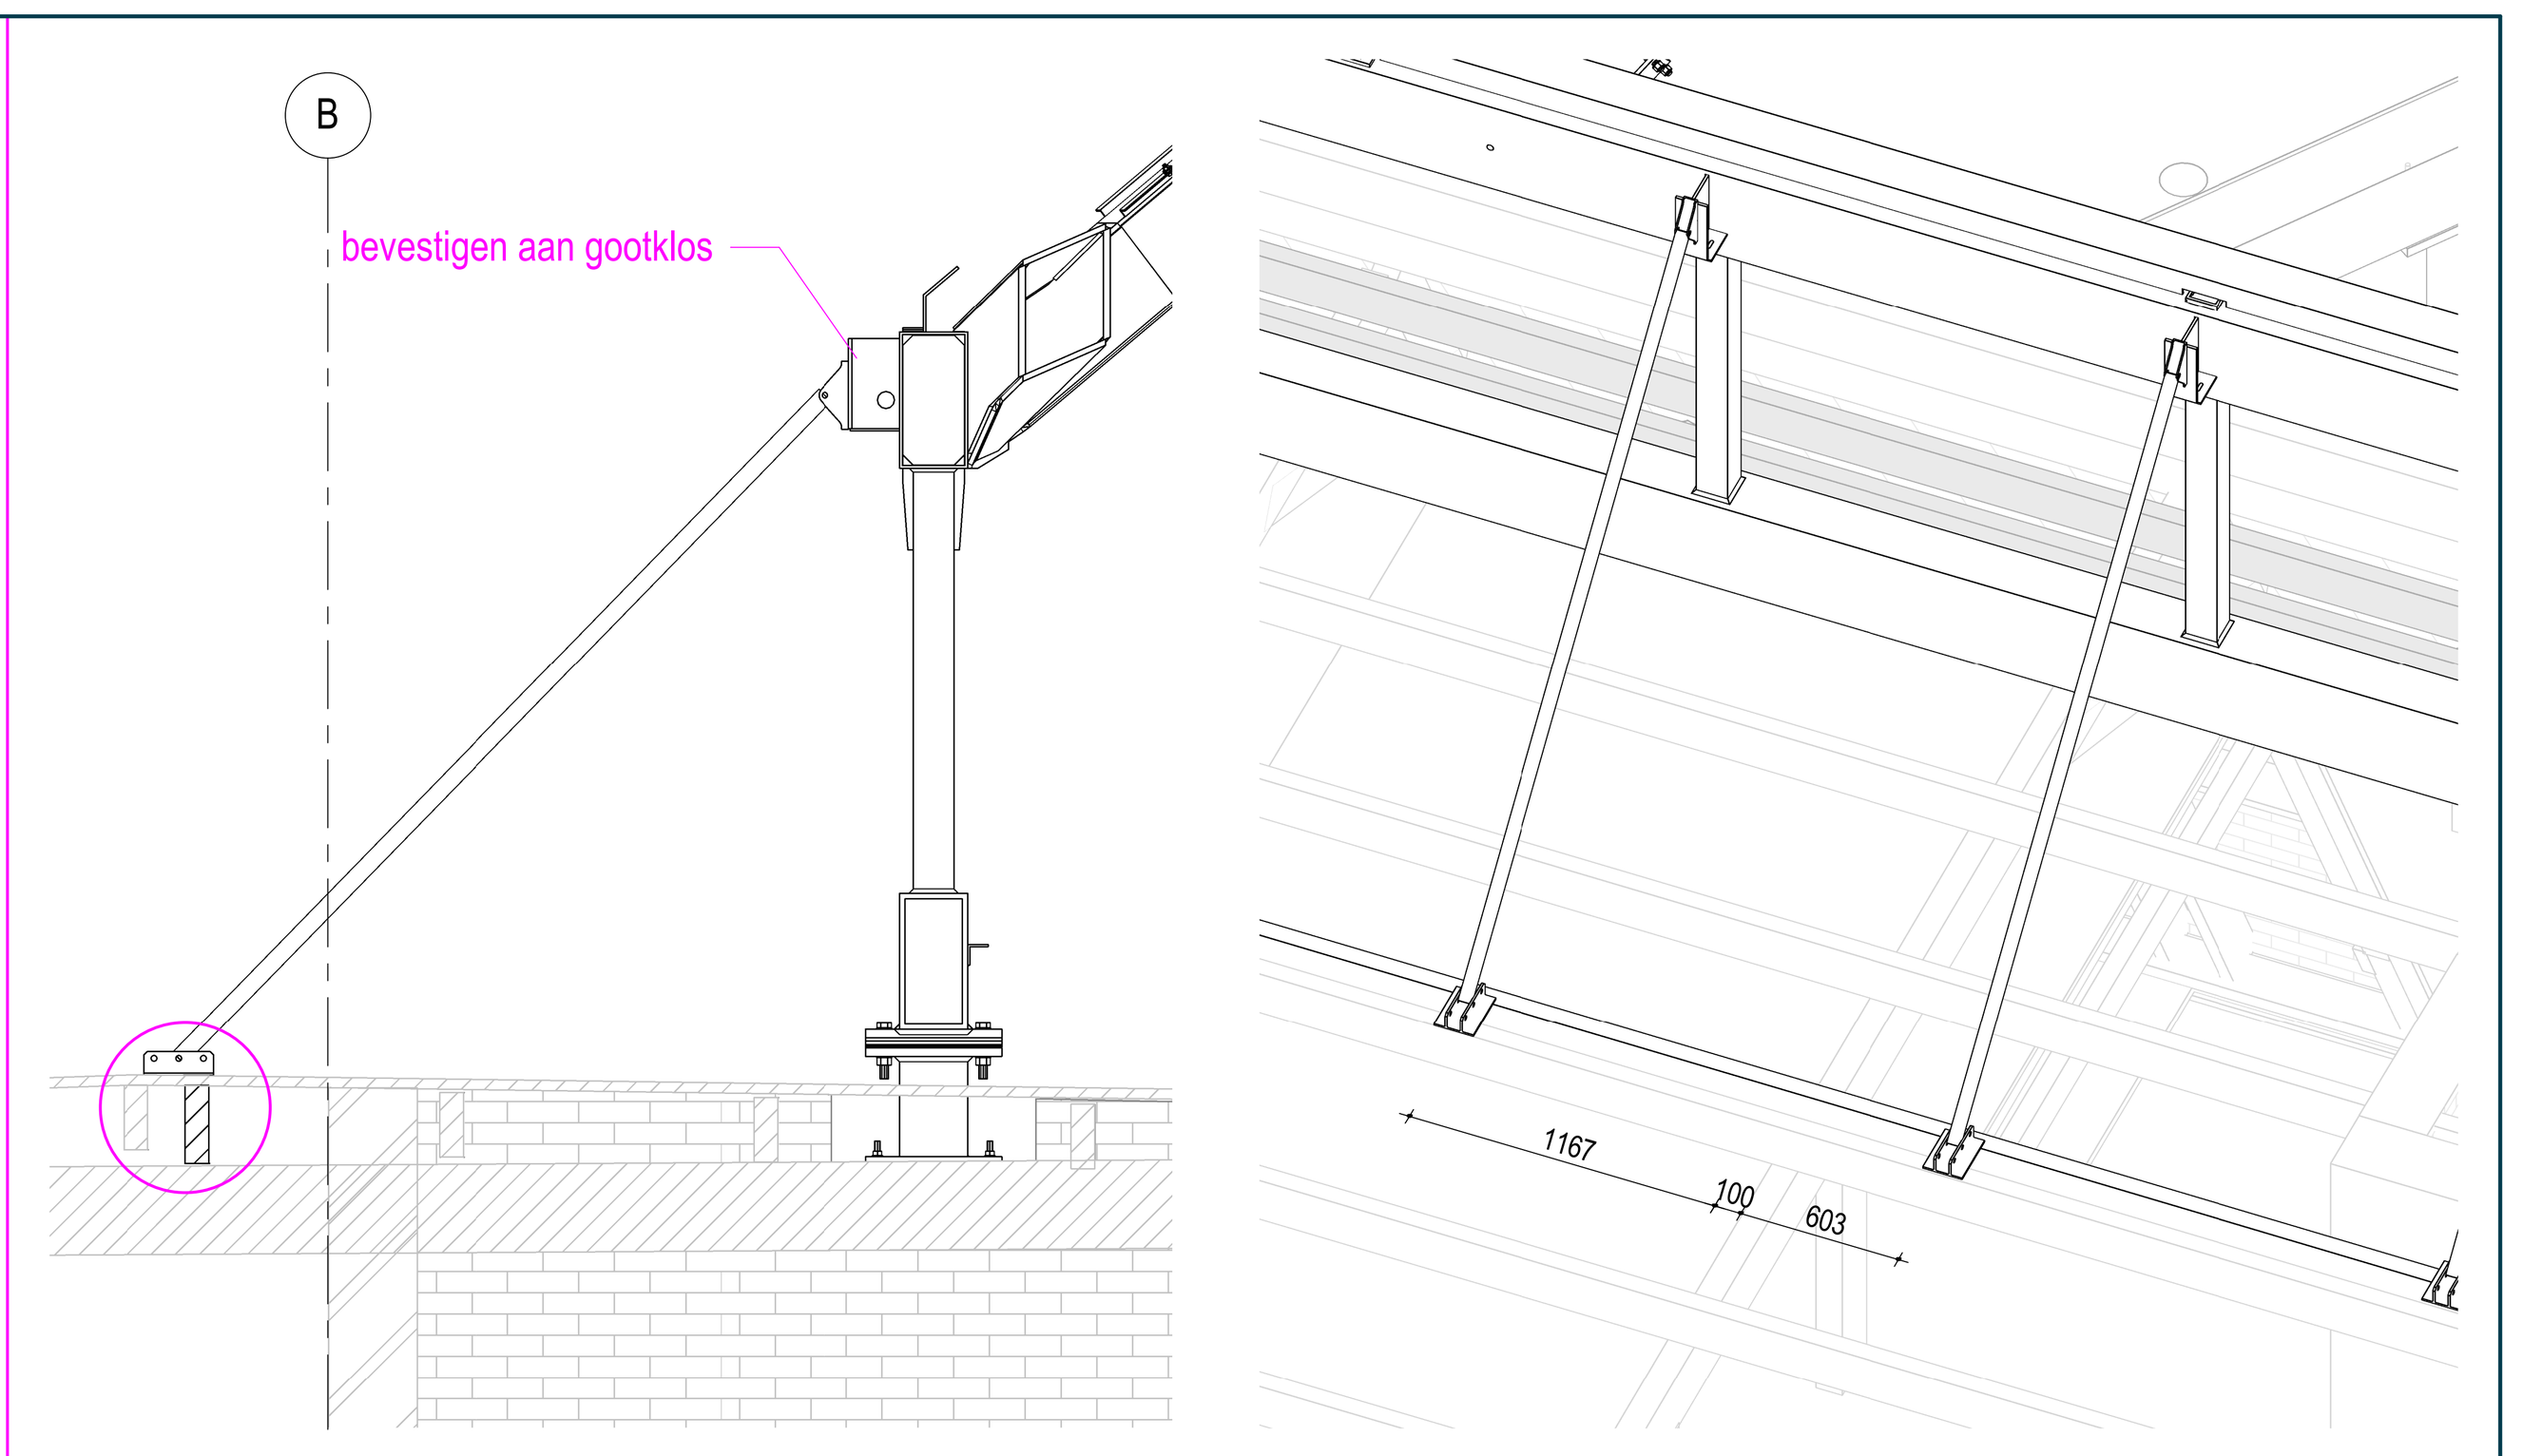

Stap 16c

Principe afschoren spanten Ring F middels trek-drukschoren schoor bevestigen middels slotbouten door dakbeschot. Detail wordt nog beschouwd door abtW. Aantal schoren nog vast te stellen. Mogelijk extra houten klos / gording toepassen (roze omcirkeld)

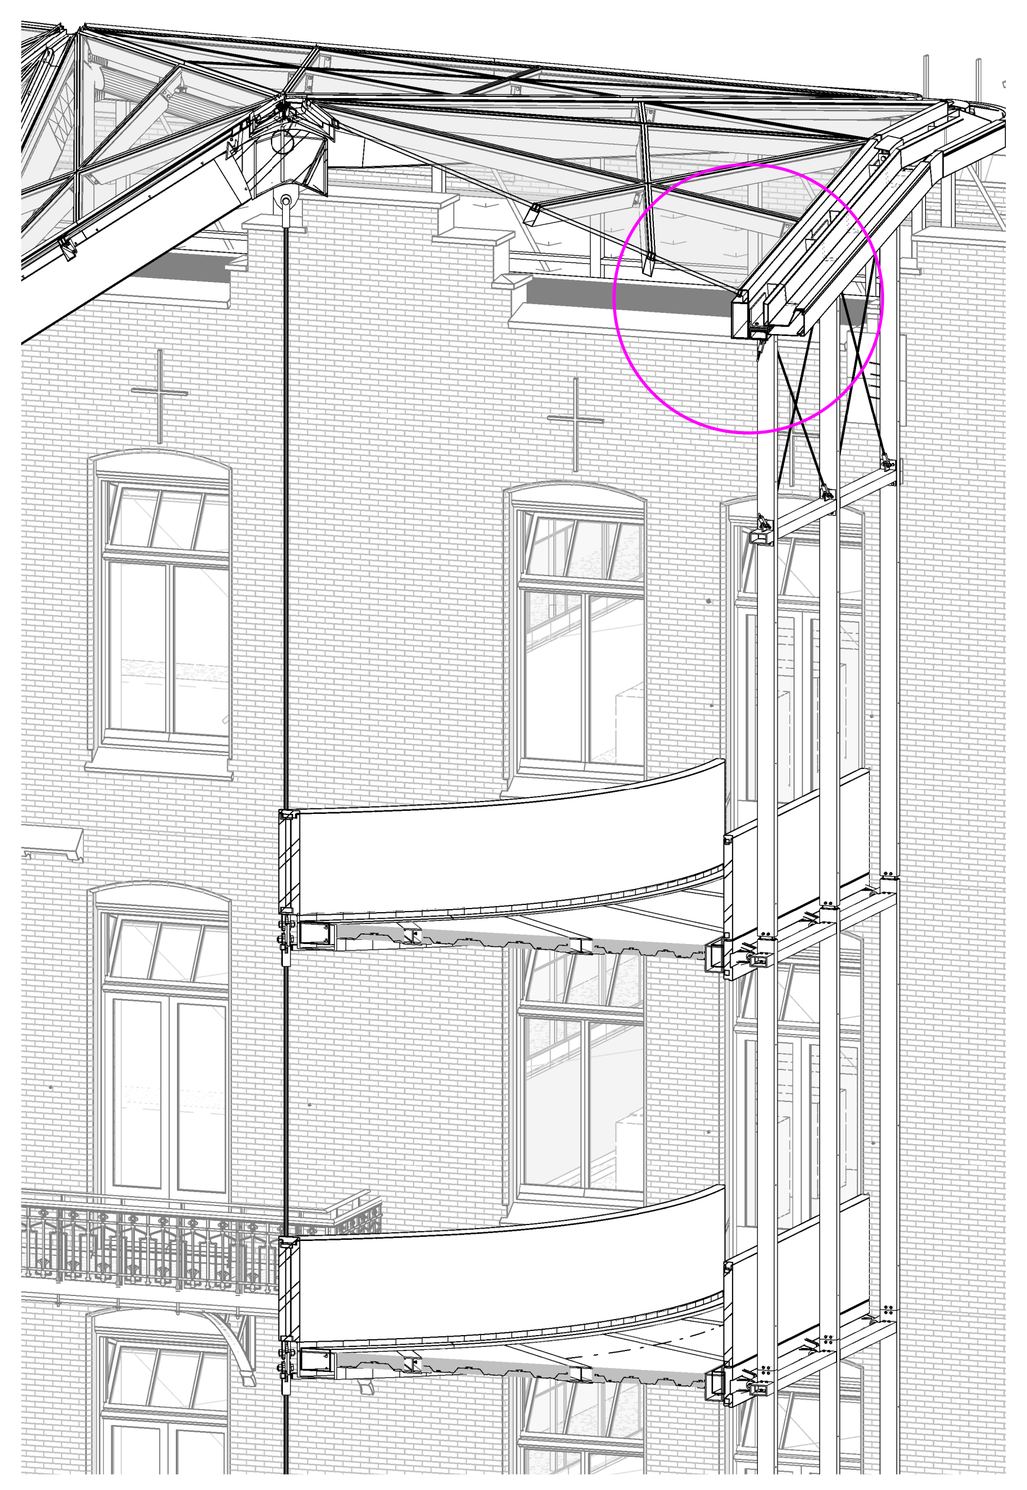

Stap 16d

Bovenregel achterconstructie vastlassen aan gevelspant E (roze omcirkeld).

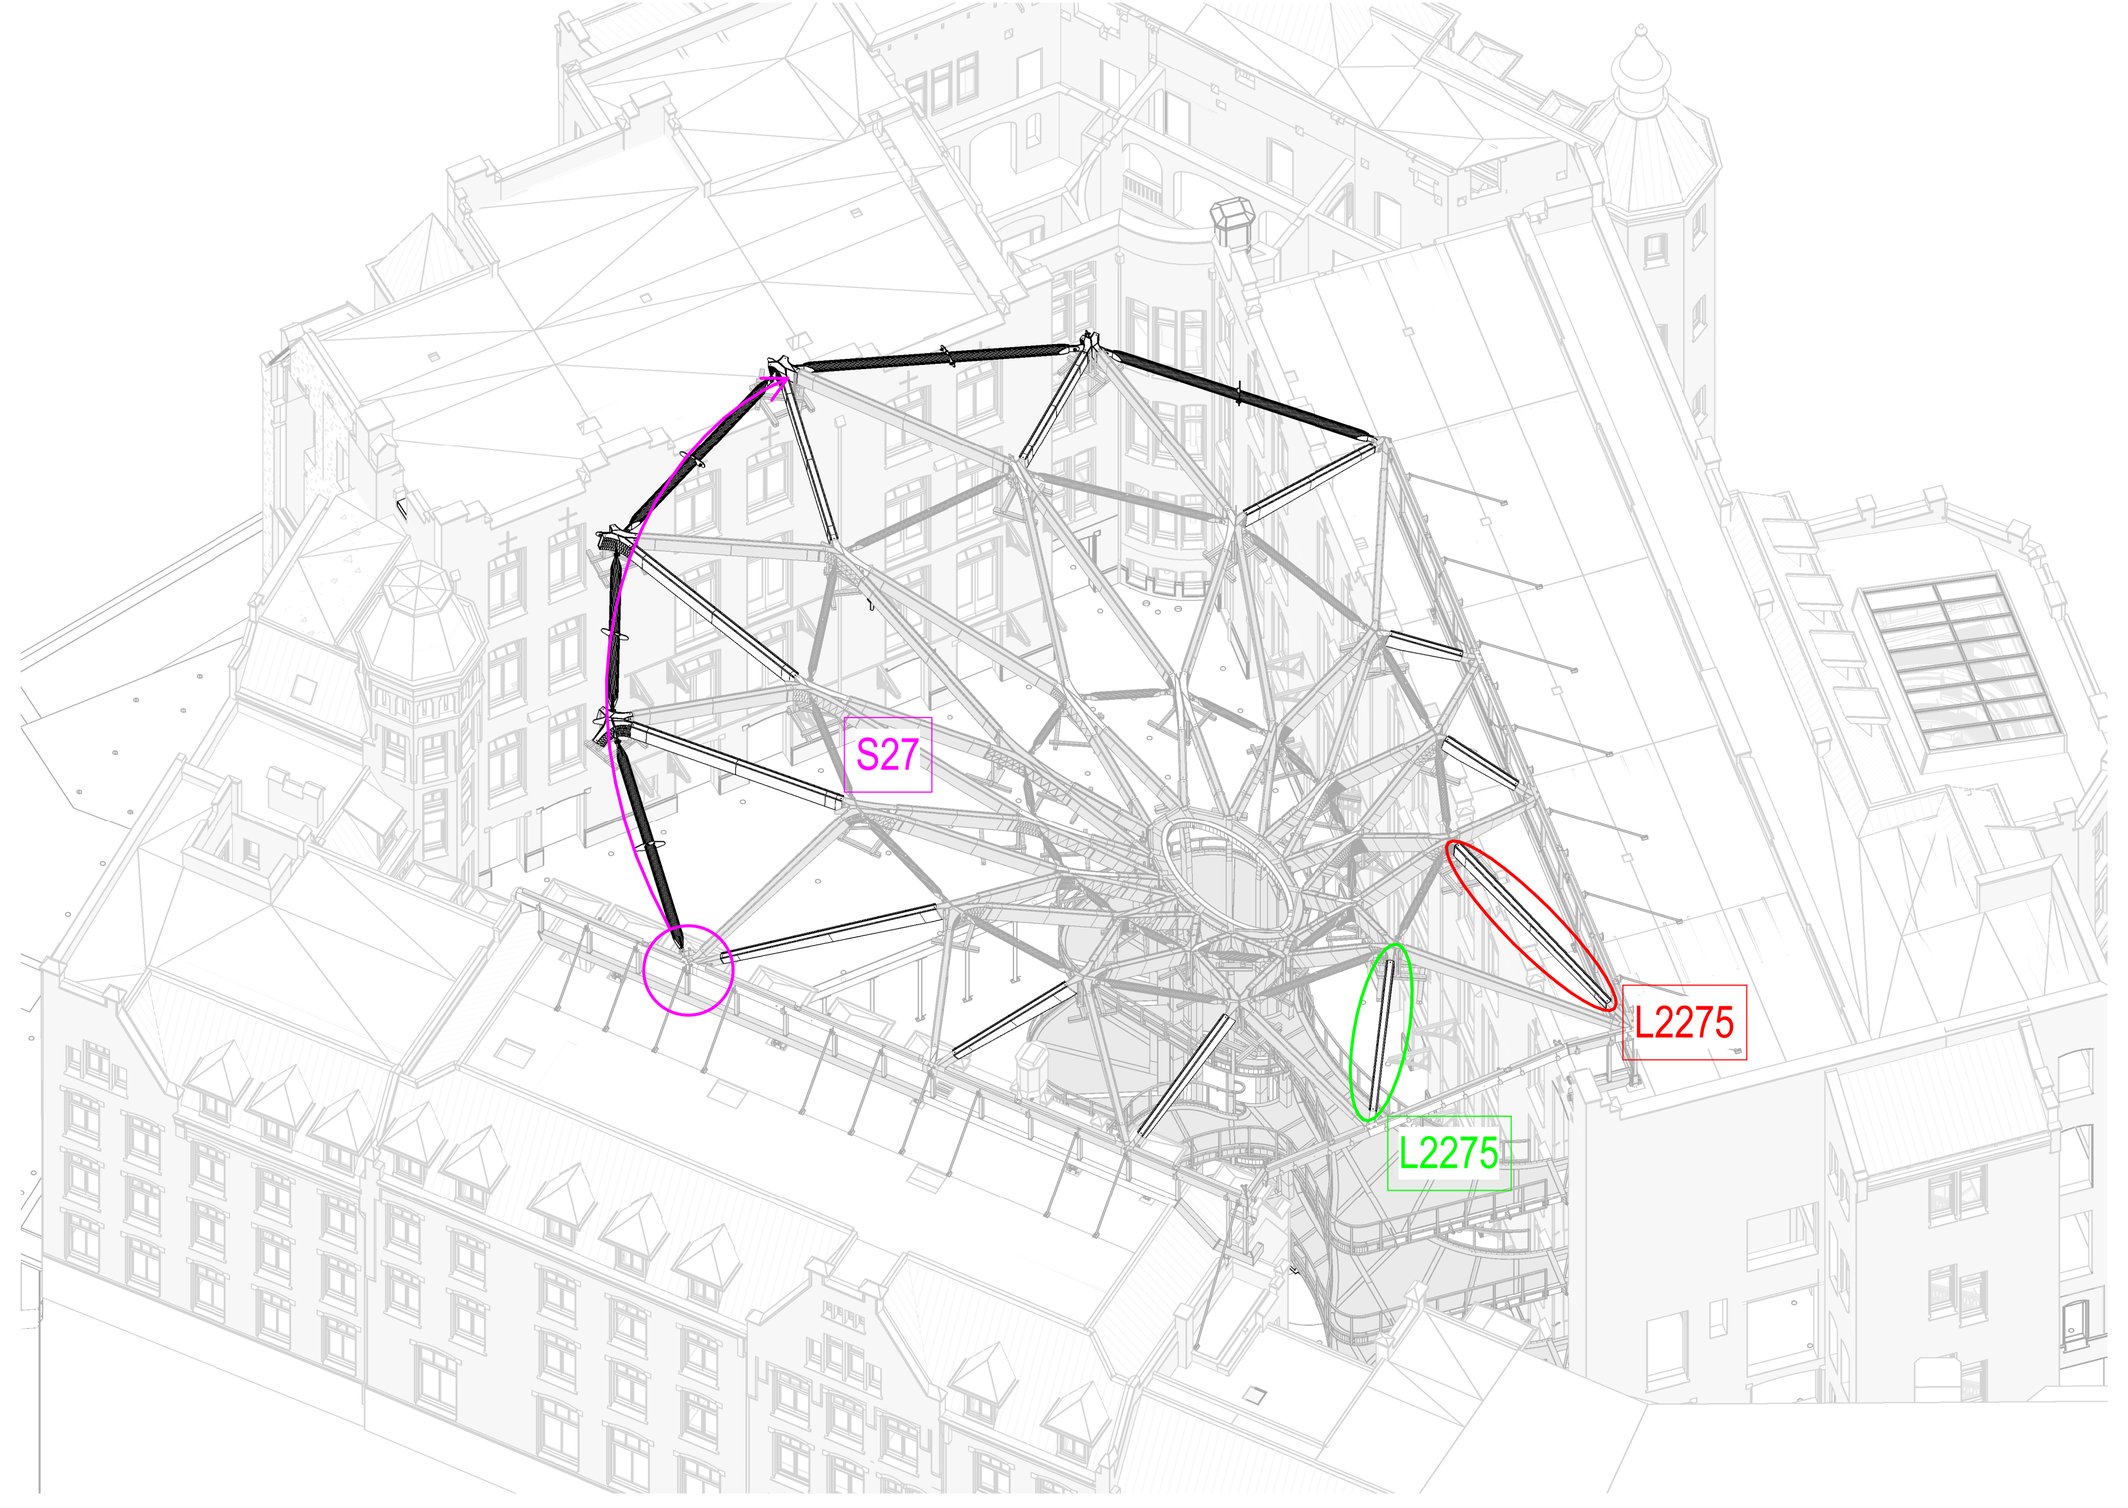

Stap 17

Realiseren "stap 31; Ring D" uit het montageplan van Buiting.

Start monteren Ring D vanaf roze cirkel.
Specificatie zwaarste deel:
 Merk: Ring D1; S27
 Lengte x breedte x hoogte: 9.004x1.488x1.142mm
 Eigen Gewicht: 1.427Kg

Liggers L2273 (groen omcirkeld) en L2275 (rood omcirkeld) vallen buiten bereik torenkraan. Montage liggers L2273 en L2275 middels mobiele telescoopkraan.

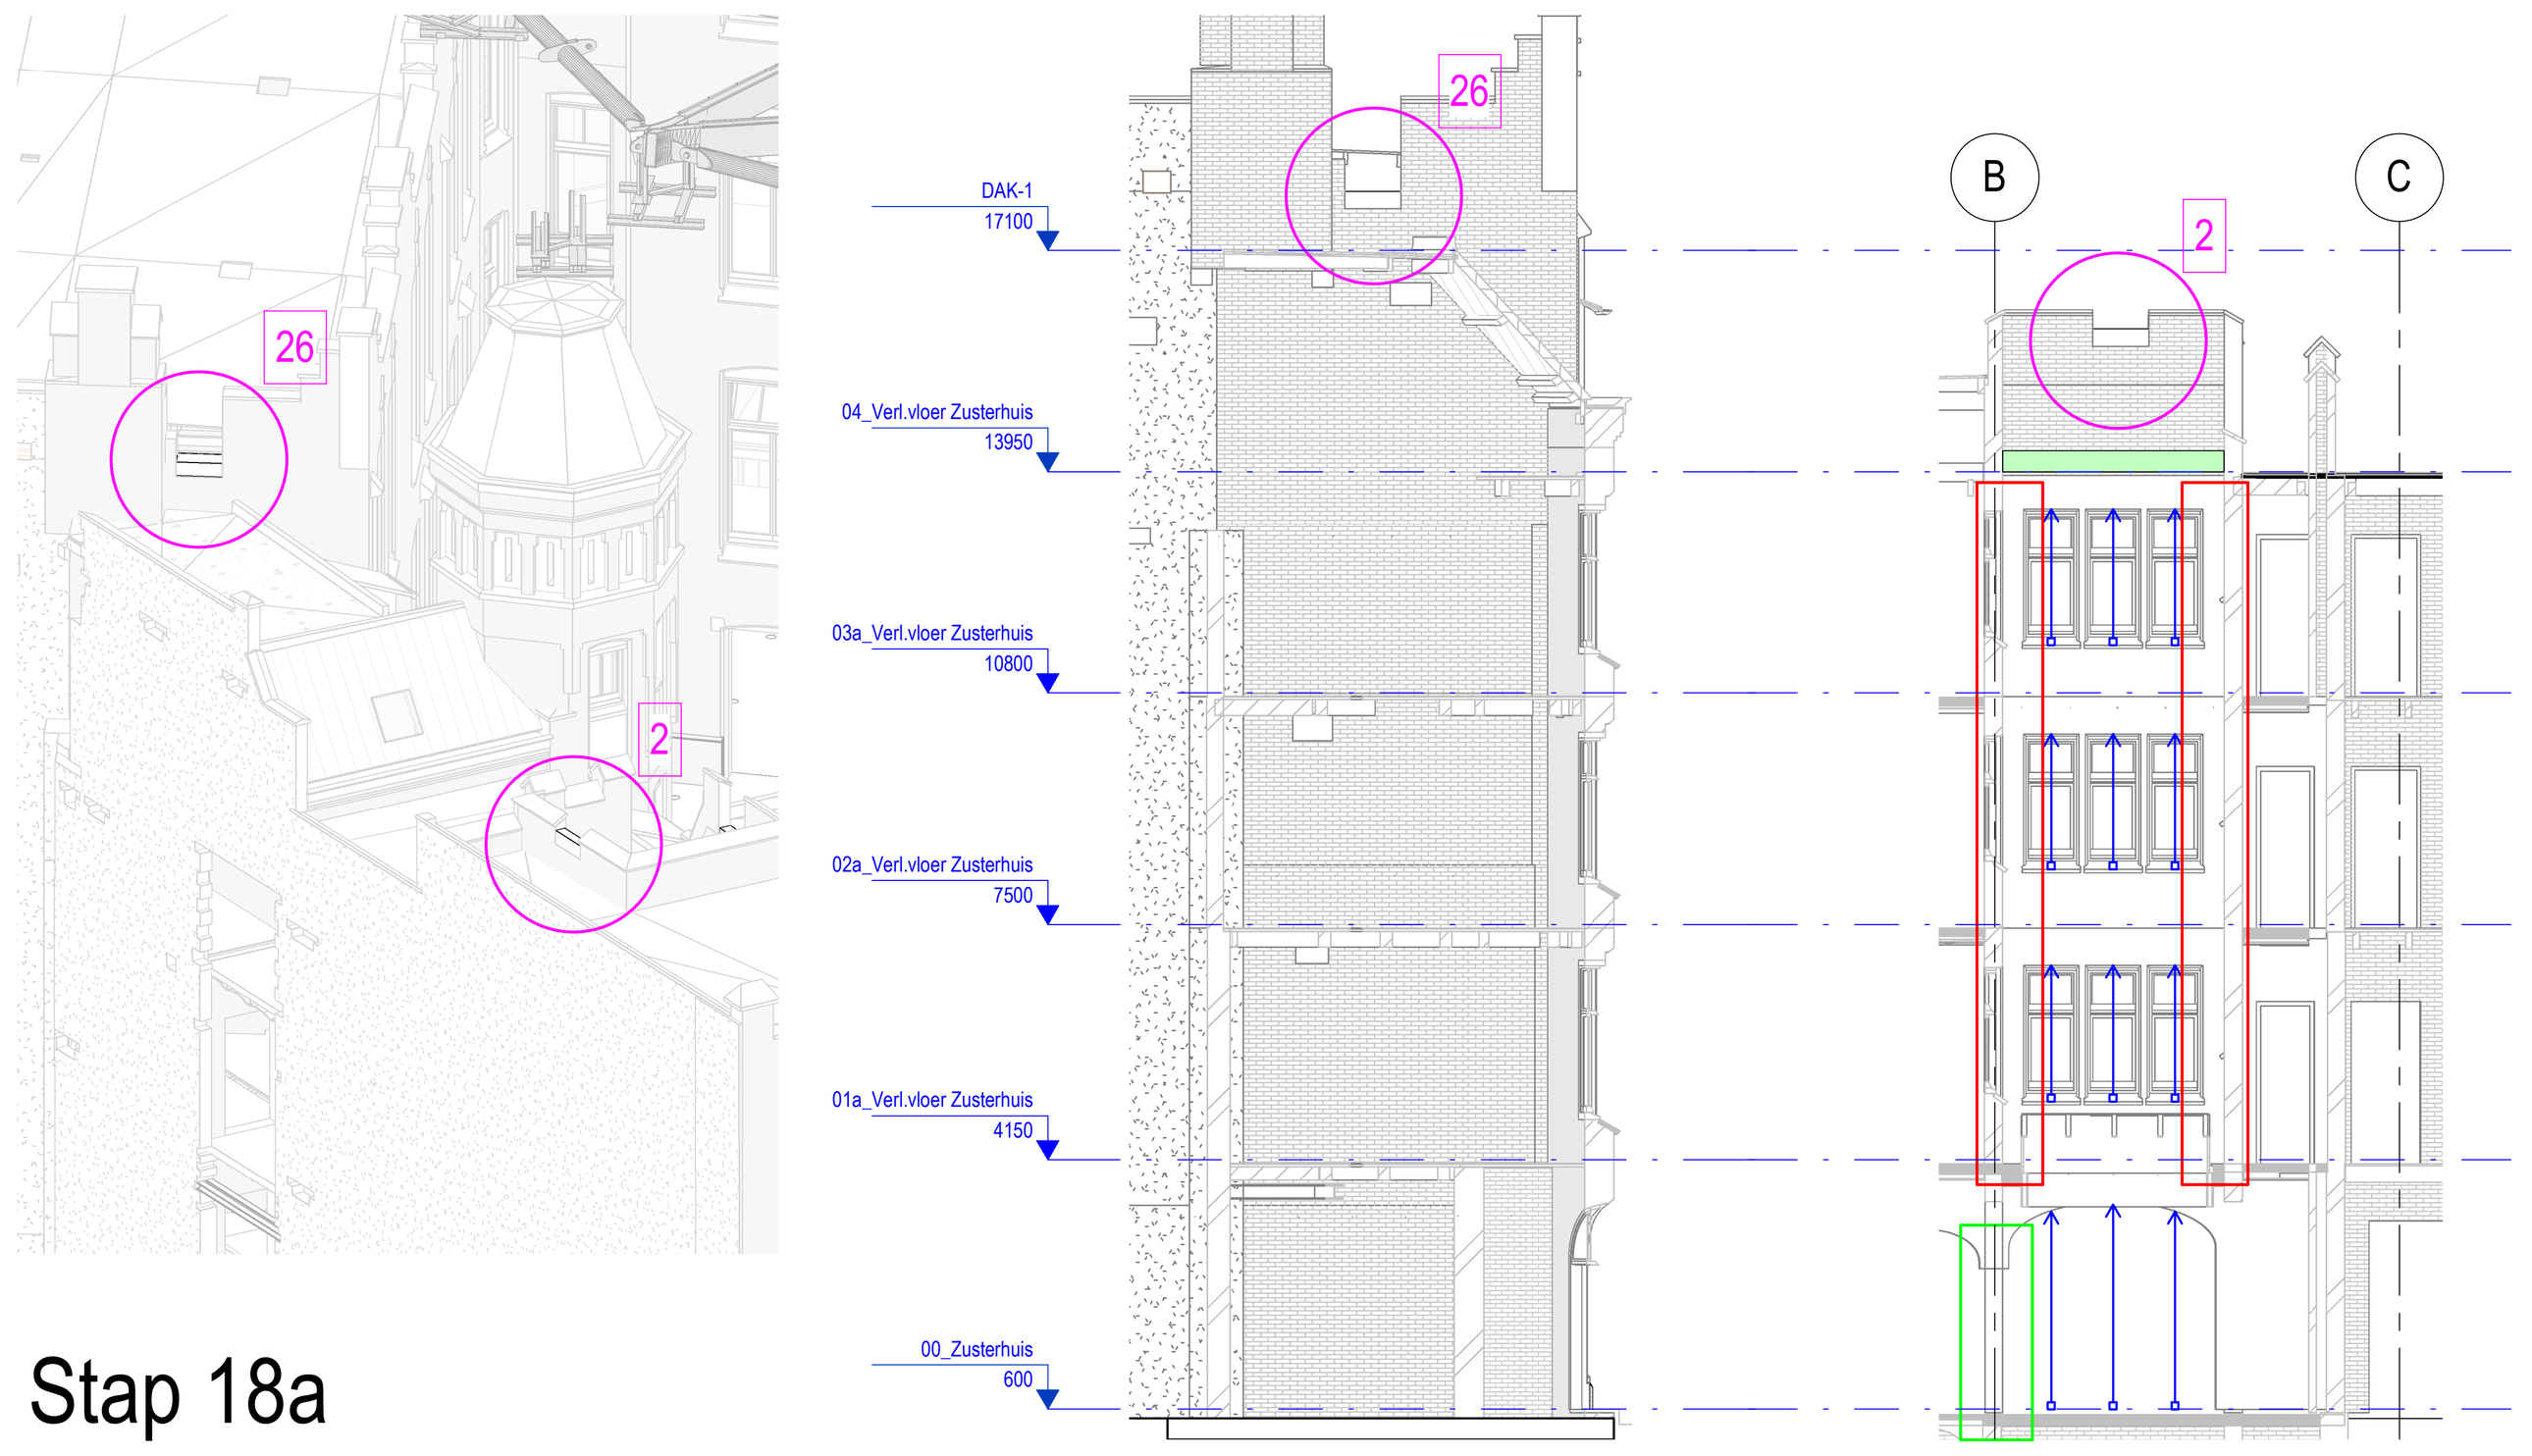

Stap 18a

Check goedkeuring bouwfaseberekening i.v.m. ontbreken casco nieuwbouw.

Stap 18b

Check constructieve goedkeuring ontwerp tijdelijke ondersteuningsconstructie knooppunt E1 en gevelspant nieuwbouw.

Stap 18c

Afstemming tijdelijke constructieve voorzieningen onder oplegpunt 2 doorstempeling cf tekening REAL_BWP_STUT-01_ZH Tijdelijke ondersteuning oplegpunt 2 (lichthof Zusterhuis) v2. Nieuwe latei t.p.v. groene arcering.
Controle bestaande constructie (penantcontrole metselwerk (rood omkaderd) + controle kolom BGG (groen omkaderd)) uitgevoerd en eventuele tijdelijke voorzieningen getroffen.
Controle in het werk of herstelwerk bestaand metselwerk van BGG tot oblekblok is uitgevoerd en afgerond?

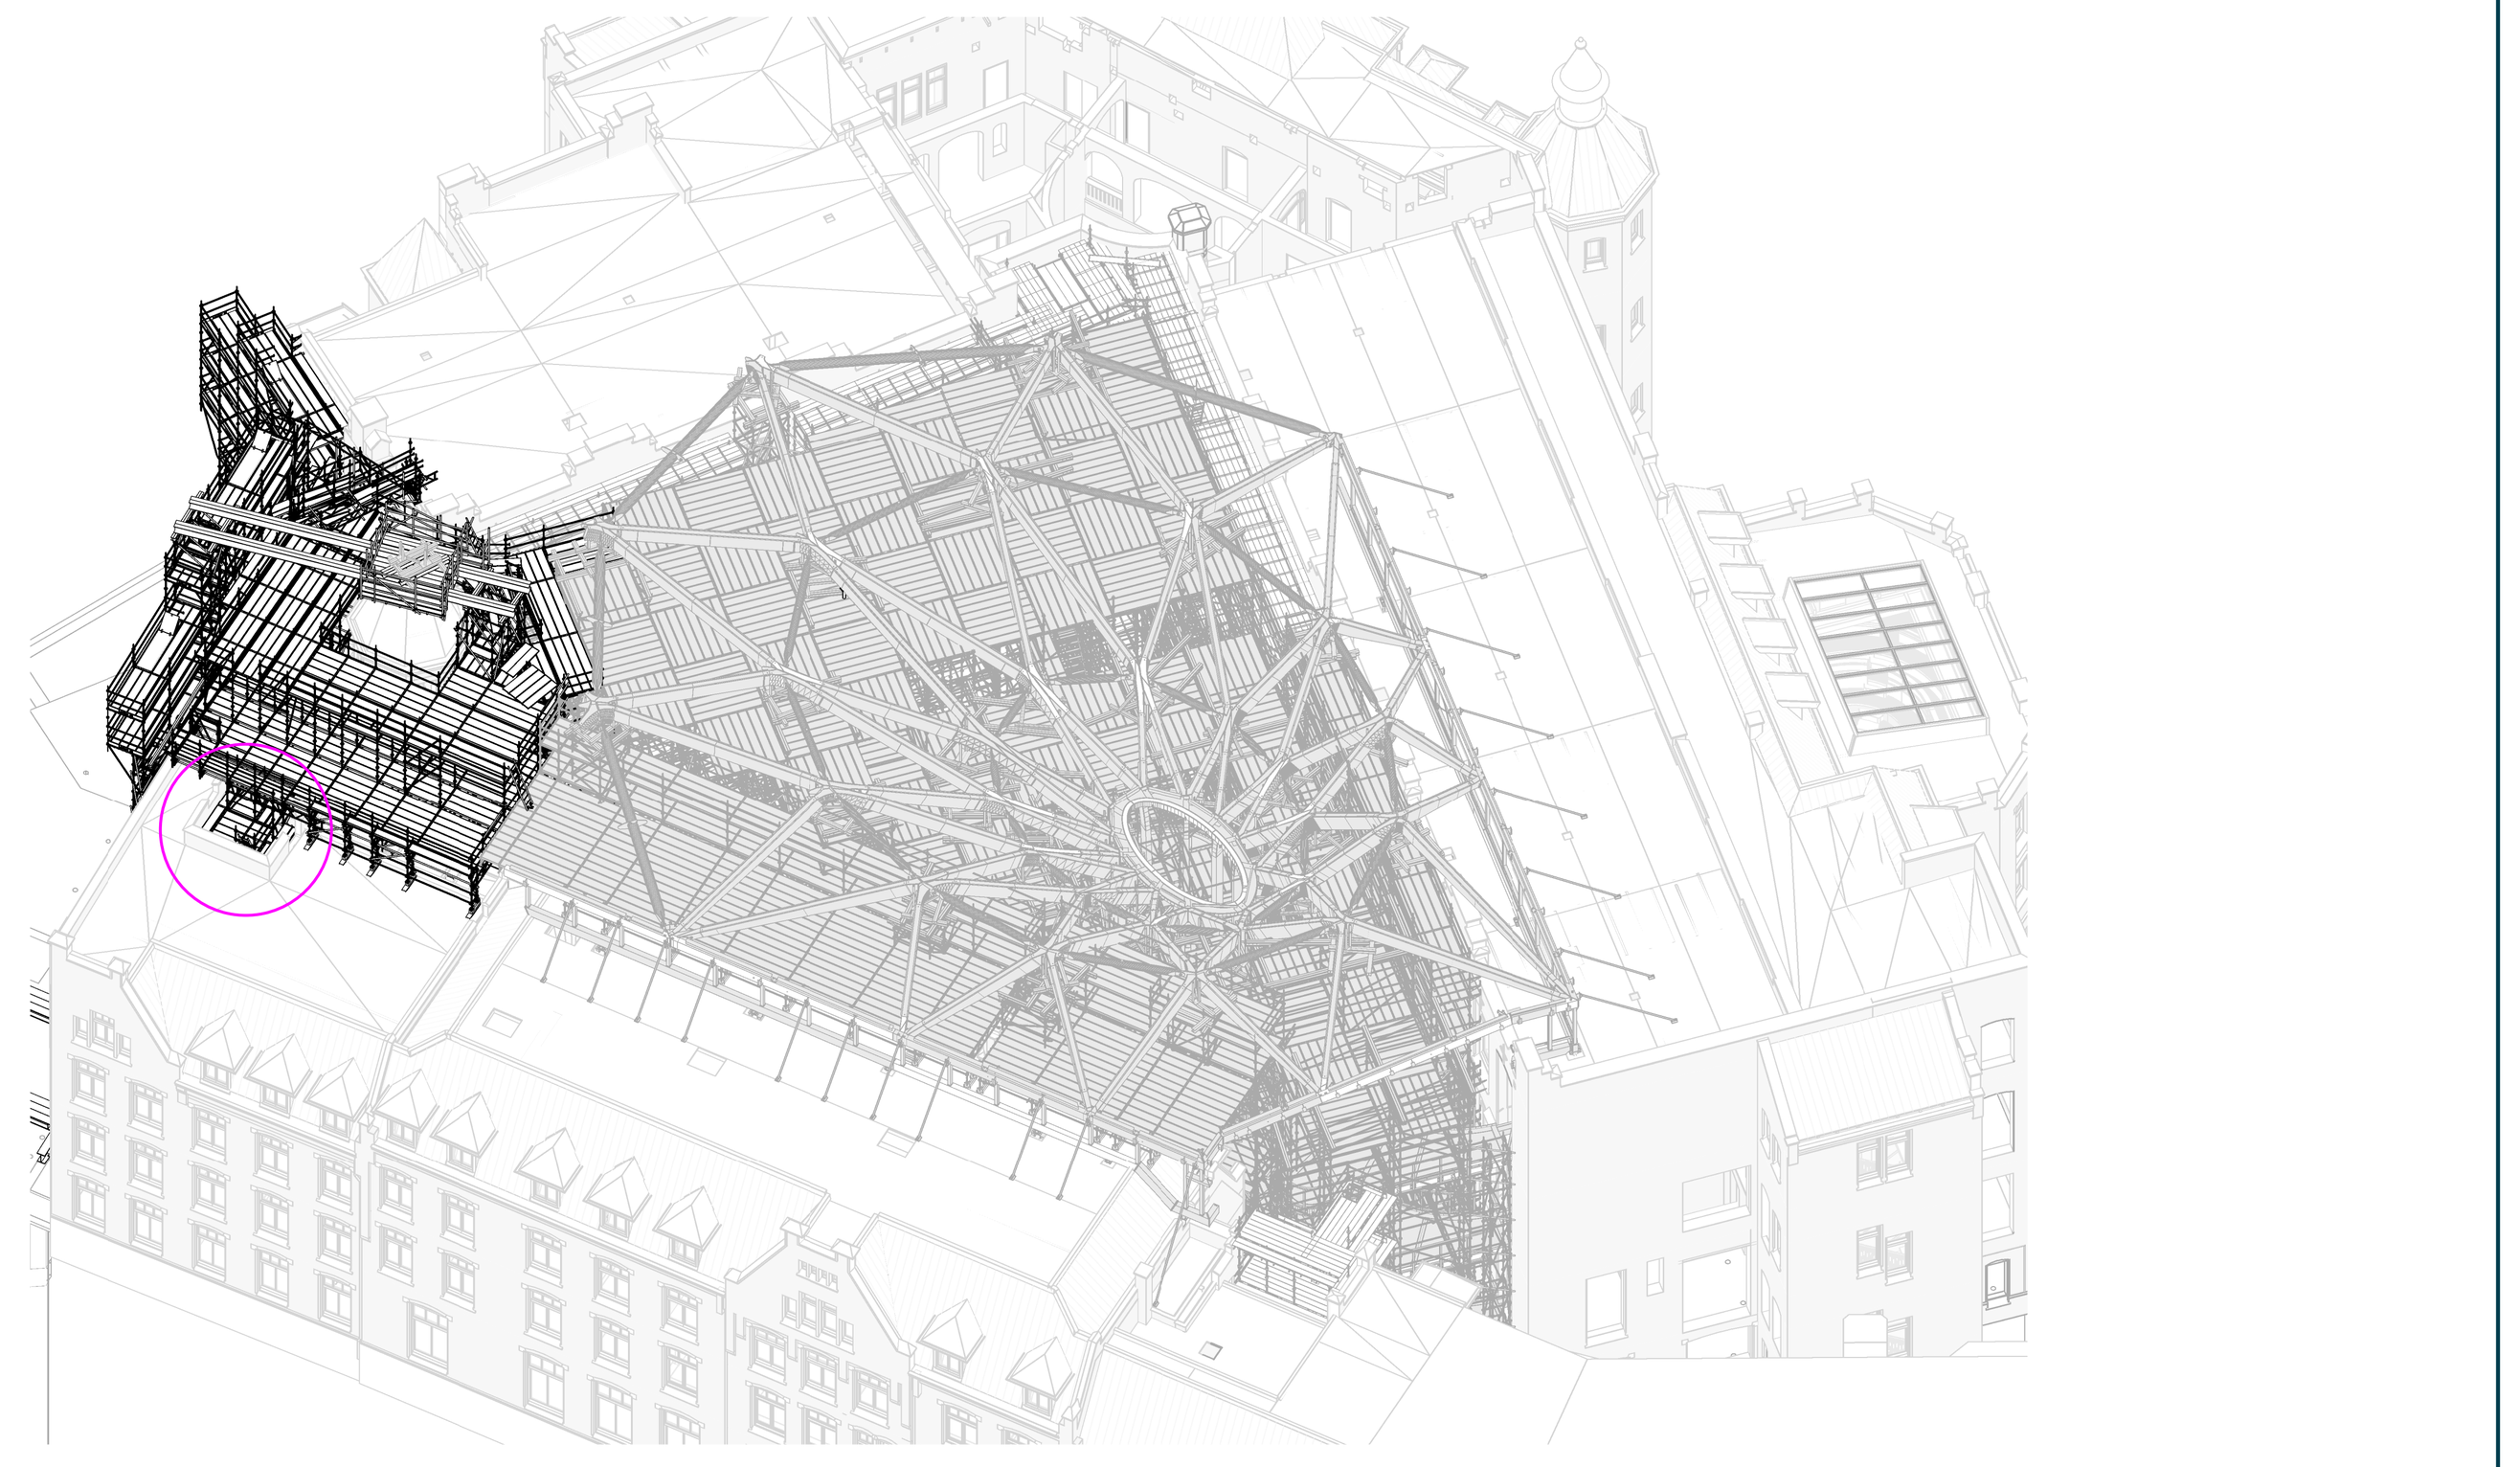

Stap 19a

Check ruimte steiger volledig gereed t.p.v. telefoon toren en werkvloer ventilatie schacht Zusterhuis gereed roze omcirkeld.

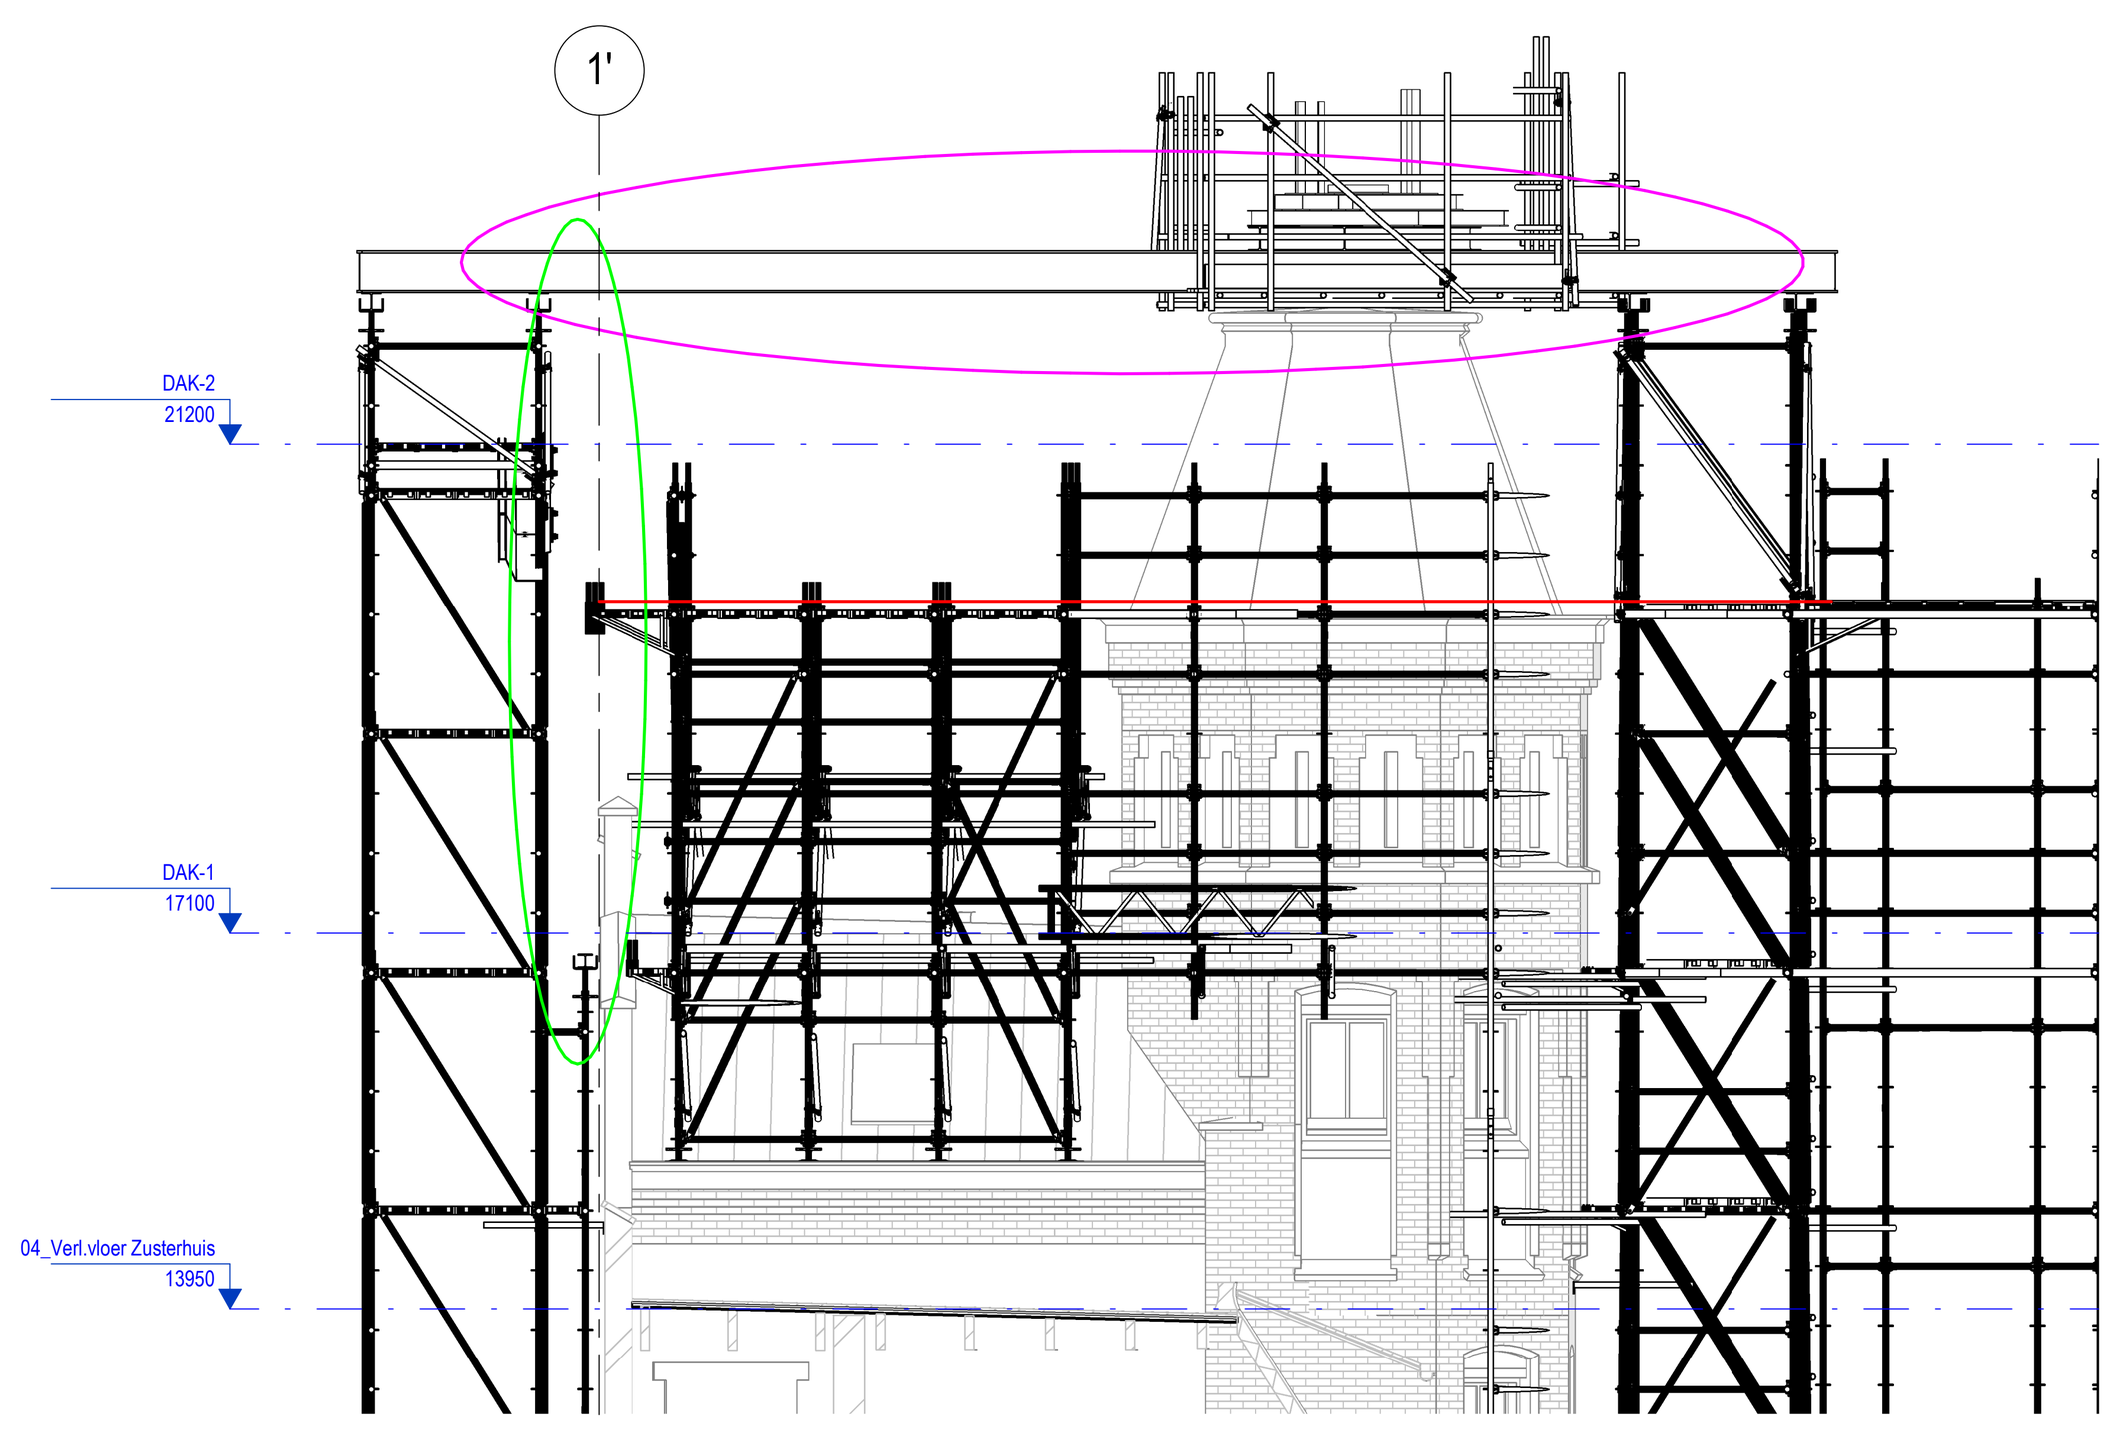

Stap 19b

Definitieve uitvoering ondersteuning knoop E1 t.p.v. telefoontoren (roze omcirkeld) en opvanging gevelspant S37 middels tijdelijke ondersteuningsconstructie (groen omcirkeld)

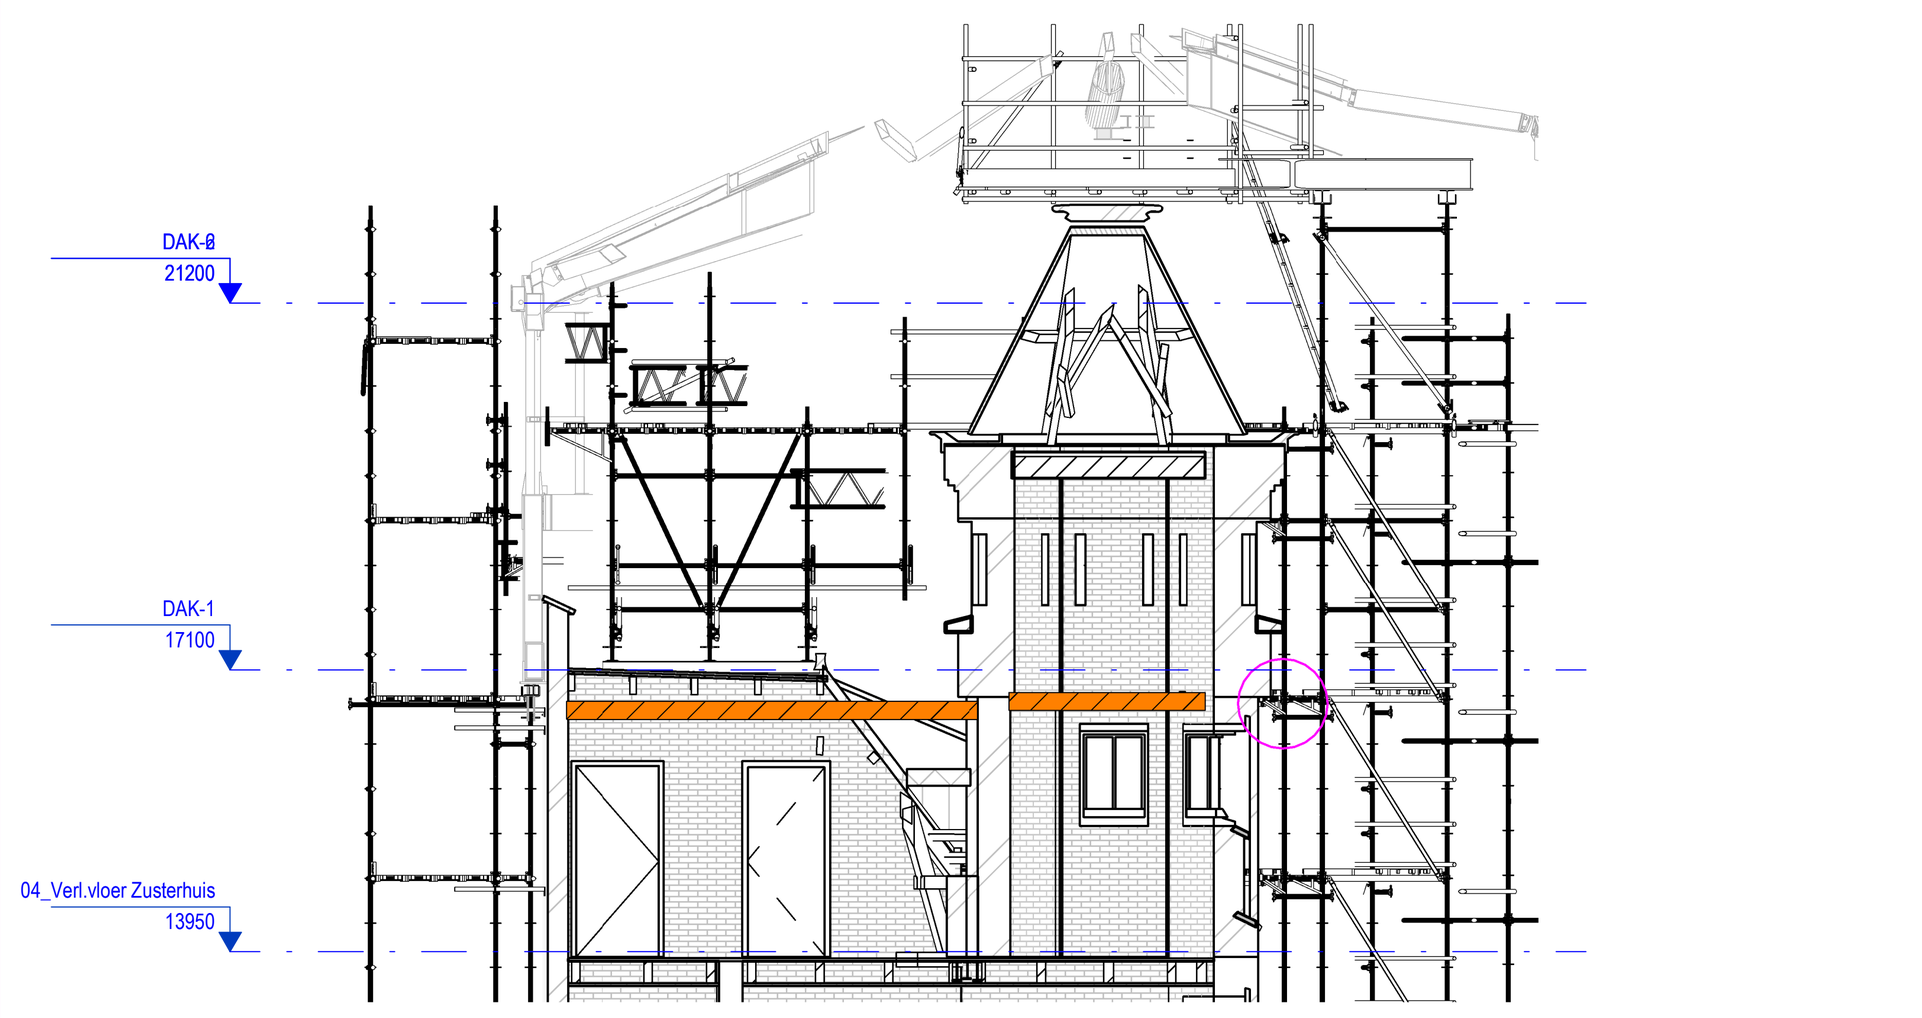

Stap 19c

Houten balken (2 stuks afm. 75x200mm) aanbrengen t.p.v. gevelverankering steigerwerk telefoontoren (roze omcirkeld) om eventuele horizontale krachten vanuit atriumsteiger door te leiden naar gevelsteiger zijde nieuwbouw.

Stap 20

Ondersteuningssteiger t.p.v. knooppunt E1 en gevelspant nieuwbouw door steigeradvies Arbor gekeurd en vrijgegeven op correcte constructieve uitvoering. Controle bouwplaatsveiligheid ondersteuningssteiger t.p.v. knooppunt E1 en gevelspant nieuwbouw door KAM-coördinator BINX

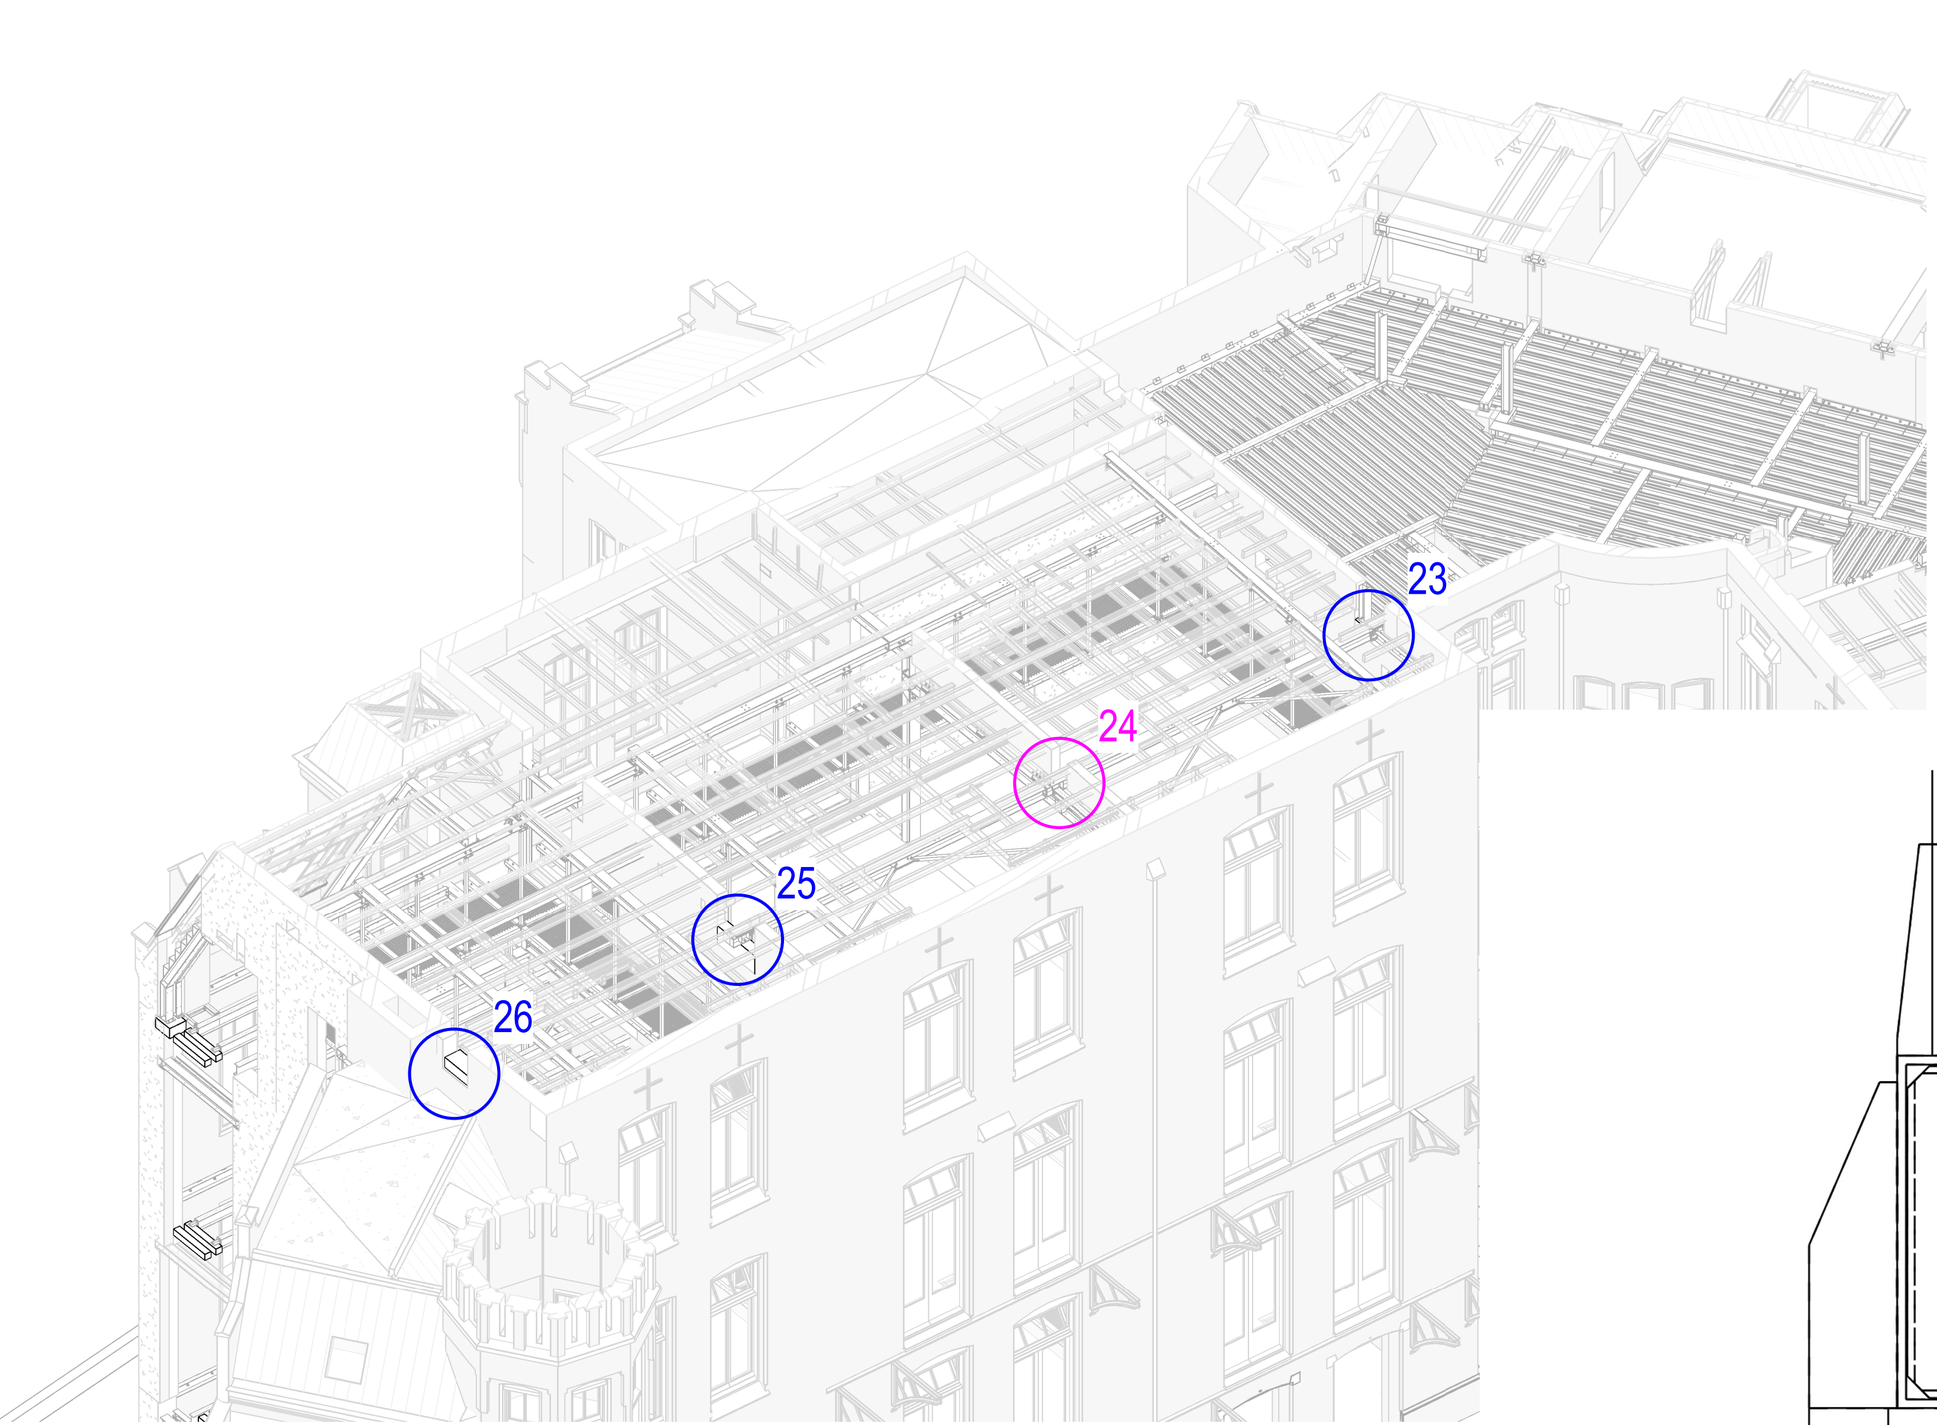

Stap 21

Check staalconstructie (roze omcirkeld) en staalconstructie inclusief betonnen oplekblokken (blauw omcirkeld) Klinieken tussen stramien REF-3c en REF-3h t.b.v. ring F gereed.

Posities van de oplegpunten t.p.v. Klinieken links zijn roze / blauw omcirkeld.

P.S. Eventuele modificatie aan dakligger Kliniek nog benodigd i.v.m. wijziging onderrand detail Ring F op basis van detailberekening D009 (roze omcirkeld)

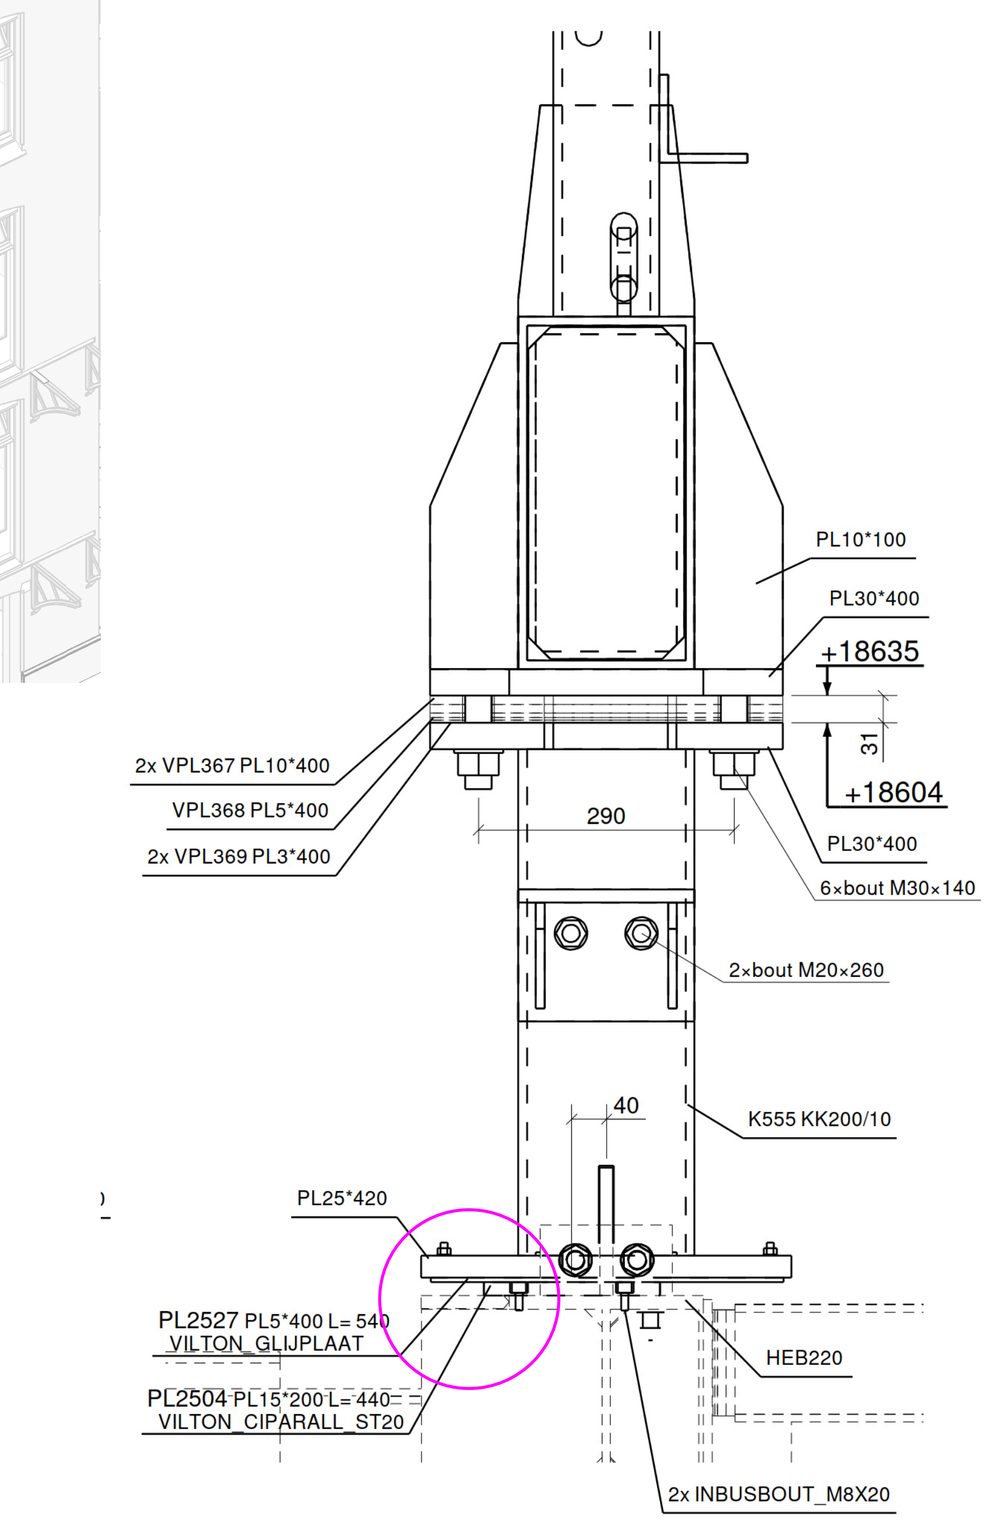

Principe detail oplegpunt 24

abtWassenaar

Gecontroleerd op constructieve uitgangspunten

Naam: Agroeneveld
Datum: 14-06-2023
Opmerkingen: geen

E	Opmerkingen abtW 9-6-2023 verwerkt	YM	12-06-2023
D	Stappenplan definitief gemaakt van stap 12b t/m stap 37	BE	26-05-2023
C	Stappenplan aangevuld / geupdated vanaf stap 12b	BE	16-05-2023
B	Aanvulling stappenplan nav controle abtW	YM	04-10-2022
A	Aantekeningen Kickoff 01-09 verwerkt	YM	29-09-2022
Revisie	Revisie omschrijving	Rev. by	Rev. Datum



QR code:

BINX Smartility & Koninklijke Woudenberg
Bolwerk 2
7141 JM Groenlo
085 53 63 000
www.bi-smart.nl
Voorstraat 7
4233 EA Ameide
088 35 59 600
www.koninklijkewoudenberg.nl

Project:
Kavel III Bovenbouw
Universiteitsbibliotheek
Binnengasthuisstraat 19

Opdrachtgever:
Universiteit van Amsterdam

Onderdeel:
Stappenplan montage kapconstructie (3/9)

Fase:	Status:	Bouwlaag:	Werknr.:
REAL	Definitief	-	PX20021
Formaat:	Schaal:	Datum:	Bladnr. UvA:
A0	-	30-08-2022	
Getekend:	Gecontroleerd:	Wijziging:	Bladnr.:
YM	ISp	E 12-06-2023	REAL_CO_966

...\PX20021_UVA_BWK_Steiger_Faseringsmodel.rvt   13-6-2023 15:12:49
